

附件

K 公司工程设计变更管理办法 (2024 年修订版)

第一章 总 则

第一条 为规范 K 公司（以下统称“集团公司”或“集团”）建设工程设计变更管理和设计变更审批程序，提高工作效率，防范设计变更廉洁风险，根据《中华人民共和国建筑法》《国资委关于加强市属国有企业工程变更综合监管的指导意见》以及相关文件规定，结合集团公司实际，制定本办法。

第二条 工作目标

构建决策有据、运行有效、监督有力的监管及实施体系，规范变更行为，堵塞管理漏洞，促进廉洁从业，实现国有资产增值保值。

第三条 定义及适用范围

工程设计变更是指集团公司投资建设项目在施工图编制完成后，在工程实施时对施工图的修改、完善等活动。

采用代建、施工总承包及工程总承包（EPC）等模式的项目应在遵守合同相关约定前提下，执行本办法。

集团公司下属各级全资、控股公司参照本办法制定相应的工程设计变更管理办法细则，报集团公司工程建管中心备案。

政府投资资本金注入项目除按本办法履行内部流程外，应严格按《建设工程设计变更管理办法》执行，其中重大设计变更需提交局审批同意后方可实施。

第四条 管理原则

（一）设计变更管理应遵循“高效透明、合理合规、严格审批、先批后建、责任明确”的原则，严禁弄虚作假、未经批准擅自实施等行为。

（二）设计变更技术方案及工程造价实行分类分级审批，严禁肢解变更，多次申报。

（三）鼓励优化设计、优化施工方案以提高工程质量、缩短工期、节约投资。

（四）设计变更应实现信息化管理。

第五条 职责和分工

（一）建设实施单位（指承担集团公司工程建设管理职责的工程建管中心或分支机构）

建设实施单位对所建设项目设计变更、签证事项及工程量等的真实性、合理性负总责。组织变更方案比选、组织专家论证，变更项目造价审核，变更台账登记。协助集团公司工程技术委员会、联合监督委员会的检查并按要求做好专题汇报工作等。

建设实施单位负责依据相关法律法规和相关合同条款，对在

设计变更中负有责任的有关单位进行追责，并依照有关规定对工程设计变更中负有责任的市场主体向集团公司提出不良行为认定申请。

（二）工程技术委员会

集团公司工程技术委员会负责施工图编制完成后实施阶段的设计变更技术评审等工作。工程技术委员会负责人由集团公司分管领导担任，成员包括工程技术管理、成本核算、规划设计、项目投资等专业人员，必要时可从国资委服务平台组建的设计变更专家库中聘请外部专家。工程技术委员会按照诚信、独立、专业原则开展设计变更技术评审，工作内容包括：分析设计变更产生的原因，对变更事项的可行性、必要性以及变更方案的可行性、经济性等事项进行专业研判和科学论证。

工程技术委员会下设办公室，办公室设于集团公司工程建管中心，负责工程技术委员会日常工作，负责牵头集团公司设计变更相关制度制定、执行情况指导；负责为设计变更管理提供技术支持；统筹设计变更情况汇总发送至集团公司纪检监察室（监事会办公室）；每半年对全部设计变更信息进行分类统计分析，形成专题报告，报工程技术委员会及联合监督委员会。

（三）联合监督委员会

集团公司纪检监察室（监事会办公室）承担联合监督委员会日常事务工作，联合监督委员会由纪检监察、监事会、财务总监、

内部审计、内控、风控等监督主体根据职责分工，针对性开展设计变更监督。

第二章 设计变更的分类

第六条 建设实施单位应当按照下述类别对设计变更的主要原因进行判别和审定

（一）外部环境、条件变化原因。

1. 政策、规范或规划调整。因政策、工程技术规程规范、标准或规划调整、行业主管部门规定等因素导致的设计变更。

2. 不可预见因素。自然现象、社会现象、不可抗力或其他无法预见因素导致的设计变更。

（二）工程相关方面原因。

1. 建设单位需求变化。因项目实施过程中建设单位提高或降低建设标准，增加或减少建设内容、改变功能等因素导致的设计变更。

2. 勘察原因。因勘察结果误差、特殊地质情况，或工作缺陷导致的设计变更。

3. 设计原因。因补充、优化设计，或设计缺陷导致的设计变更。

4. 其他。因上述以外的其他原因导致的工程设计变更。

（三）工程总承包（EPC）项目根据合同约定若属于设计变

更，应参照本办法执行。

（四）其他原因导致的设计变更。

第七条 设计变更划分为重大设计变更、一般设计变更两类。

（一）重大设计变更根据金额划分指单项或一次性设计变更造价在 200 万元以上的设计变更，划分为 A、B、C 类变更。

1. A 类变更（变更金额 1000 万元以上）

2. B 类变更（变更金额 400 万元以上 1000 万元以下）

3. C 类变更（变更金额 200 万元以上 400 万元以下）

（二）符合以下情形之一的设计变更为重大设计变更，按照对应变更金额履行审批程序，若变更金额在 200 万元以下的，按 C 类变更履行审批程序：

1. 工程任务、规模、工程等级及设计标准发生变化；

2. 属于集团重大投资项目，发生工程总体布局、布置方案、技术路线、工艺方案、主要建筑物结构型式、重要机电与金属结构设备、重大技术问题的处理措施、施工组织设计方案等方面变化，对工程的质量、安全、工期、投资、效益产生重大影响。

（三）一般设计变更指单项或一次性设计变更造价在 200 万元以下的设计变更，划分为 D、E、F 类。

1. D 类变更（变更金额 50 万元以上 200 万元以下）

2. E 类变更（变更金额 5 万元以上 50 万元以下）

3. F 类变更（变更金额 5 万元以下）

集团公司下属各级全资、控股企业可结合实际，参考集团公司分类标准，确定设计变更的分类标准及层级，原则上不得突破以上金额限制，具体金额标准及分类方式应在报集团公司备案的设计变更管理制度中列明。

第八条 工程延期补偿

（一）因设计变更造成的工程延期补偿，应在审批事项中一并提出申请。

（二）非设计变更造成的工程延期补偿，如不可抗力、工程技术规范、政策标准或规划等原因，由建设实施单位自行组织审批。

第三章 设计变更分级审批

第九条 设计变更审批原则

（一）重大工程集中审批

为强化重大设计变更管理，除应急抢险、危及人身及重大财产安全等特殊情形外，所有重大设计变更需报集团公司审批后实施。

A、B类变更在重大设计变更决策前，建设实施单位应将变更资料报集团公司工程技术委员会和联合监督委员会审议（C类设计变更集团公司分管领导认定如确有必要，建设实施单位可提交工程技术委员会会议审议）。工程技术委员会应及时召开会议，

对重大设计变更开展技术评审，并出具书面评审意见，供集团公司决策参考。

联合监督委员会应派人列席重大设计变更技术评审和决策会议，全程监督评审过程和决策程序。

（二）一般设计变更审批

集团公司下属各级全资、控股公司应参照集团公司划分标准建立健全设计变更分级管理制度，明确设计变更分类审批权限和 workflows，完善内部制衡机制。

集团公司建设实施单位和集团公司下属各级全资、控股企业应按相关制度和程序对一般设计变更进行审批。

第十条 设计变更分级审批程序

A 类变更（变更金额 1000 万元以上）

在施工阶段的变更设计方案，建设实施单位组织召开工程技术委员会，整理形成《工程技术委员会审查意见》（附件 7），由集团公司分管领导审批，党委会前置审议后提交集团公司总裁办公会决策。

B 类变更（变更金额 400 万元以上 1000 万元以下）

在施工阶段的变更设计方案，建设实施单位组织召开工程技术委员会，整理形成《工程技术委员会审查意见》（附件 7），由集团公司分管领导审批后，提交集团公司总裁审批。

C 类变更（变更金额 200 万元以上 400 万元以下）

集团公司机关部门及分支机构负责实施的项目由集团公司分管领导审批。

下属各级全资、控股公司负责实施的项目向集团公司分管领导报备。

D 类变更（变更金额 50 万元以上 200 万元以下）

集团公司机关部门及分支机构负责实施的项目由集团公司分管领导审批。

E 类变更（变更金额 5 万元以上 50 万元以下）

集团公司机关部门负责实施的项目由部门主要负责人审批；分支机构负责实施的项目由分支机构主要负责人审批。

F 类变更（变更金额 5 万元以下）

集团公司机关部门负责实施的项目由部门分管负责人审批；分支机构负责实施的项目由分支机构分管负责人审批。

A、B、C 类设计变更和涉及主体、工艺等重大变化的 D、E、F 类设计变更，需由建设实施单位组织召开专家评审，整理形成《建设工程设计专家咨询意见表》（附件 6），并将评审结果及相关资料作为附件提交审议。

C 类设计变更集团公司分管领导认定如确有必要，建设实施单位可提交工程技术委员会会议审议。

备注：具体设计变更分级审批指引参照附表《设计变更分级审批指引表》；设计变更审批流程参照附图《设计变更审批流程图》。

第十一条 设计变更事项审批

（一）为加快审批效率，实行分步审批，先进行变更事项审批（应提出设计变更估算金额），再进行变更造价审核，原则上变更造价中的变更预算价不得超过设计变更估算金额的 10%，且不得超过分级审批层级；变更事项审批后即可组织实施。

（二）若变更内容简单、清晰，可通过直接套用原合同单价获得较准确价款金额时，也可不需施工单位报送变更价款，直接由建设实施单位进行预估后发起审批，提高审批效率。

（三）《工程设计变更（签证）联系单》（附件 2）、《工程设计变更呈批表》（附件 3）及其附件应包括工程设计变更事项的原因、方案、变更估算、对工期影响、必要的附图及相关资料等。

第十二条 现场签证审批

现场签证发生时须由监理单位、施工单位、建设（代建）单位等相关人员到场共同确认。现场签证要求内容完整、记录真实、说明详尽、文字表述无歧义、图示尺寸准确；计算过程符合工程量计算规则和相关规范要求，工程量计算准确；涉及金额的应明确具体金额。

现场签证的审批根据预算金额按照设计变更审批权限进行审批上报。

第十三条 特殊情况时设计变更审批

对应急、抢险、救灾、重大政治活动等特殊情况或其他突发

情况（如危及生命、工程、或工程相邻财产安全）下需立即实施的设计变更，可按审批权限向相关负责人口头报告后实施，并在 10 个工作日内启动审批流程，附相关的影像资料说明紧急抢险的情形。

第四章 设计变更实施

第十四条 设计变更的实施

施工单位根据监理单位签发的设计变更令组织工程施工。变更实施期间施工单位根据审批完成后的变更图纸实施变更施工，并在施工时做好现场图片（彩色）、影像、隐蔽工程确认等过程资料。（具体要求详见《K 司档案管理规定》）

第十五条 设计变更的确认及审核

（一）施工单位根据监理单位审核后的设计变更图纸出具施工方案和设计变更预算，由监理、造价咨询、建设实施单位初审后报造价管理部门审核；变更实施完成后填写《设计变更现场工程量确认单》（附件 4）并发起变更结算流程，报监理、造价咨询、建设实施单位、造价管理部门审核结算，审核无误后根据合同约定进行变更款项支付，保存变更原始资料以用于项目竣工结算。

备注：设计变更的确认及审核工作，建设实施单位可参照集团《建设工程造价管理办法》执行。

（二）变更工程的单价确定应遵循以下原则，次序在先者优先：

1. 合同中已有适用于变更工程单价的，按合同已有的价格确定。
2. 合同中已有类似于变更工程单价的，可以参照此价格确定。
3. 合同中没有适用或类似于变更工程单价的，但在合同中有约定具体的确定方法，承包方按合同约定计算后上报变更单价，按照程序报监理单位、咨询单位、建设单位批准。
4. 合同中未约定变更工程单价计价方法的，原则按计价标准、设计变更发生当期信息价等执行，并按合同约定的下浮率调整。

（三）在变更工程内容实施完毕后，原则上，在两个月内完成变更准确价款的核对及确认工作。

第五章 设计变更监管

第十六条 信息公示

（一）所有设计变更都需进行内部公示（如涉及商业秘密可不公示，应单独报送工程技术委员会、联合监督委员会），实现变更信息公开透明，自觉接受内部监督。集团公司各建设实施单位、分支机构和集团公司下属各级全资、控股公司于每季度第一个月 10 日前将本单位设计变更事项《工程变更台账》（附件 8）上报工程建管中心，并在 MIS 公示；上报单位同时需在本单位进

行内部公示。每半年产生的全部设计变更信息进行分类统计和分析,形成专题报告报送集团公司工程建管中心汇总后报送工程技术委员会、联合监督委员会。

(二)变更金额 400 万元以上的重大设计变更和累计变更金额超合同价 5% 以上的设计变更须在阳光采购平台进行对外公示;其余设计变更和合同续期可选择是否对外公示。

第十七条 变更溯源

集团公司各建设主体、分支机构和集团公司下属各级全资、控股公司应前移监管关口,在前期强化合同管理,明晰勘察、设计、咨询等中介机构责任,明确因中介机构履责不到位导致变更的处罚措施。工程技术委员会在发生重大设计变更以及异常变更、频繁变更时,牵头对中介机构以及施工、建设等相关单位进行源头追溯、责任界定,联合监督委员会强化对溯源环节的监督,确保不合理的变更不予审批、未审批的变更不予确认、未确认的变更不予结算。

第十八条 智慧监管

强化工程项目管理系统对设计变更的信息化管理,实现设计变更信息及时发布、审批高效透明、决策留痕。

第十九条 过程监督

集团公司工程技术委员会、联合监督委员会另行建立抽查机制,对变更项目进行定期抽查,当变更数量、金额、事由出现异常情况时,可对各项目责任主体或项目进行专项检查。

第二十条 追责问责

相关人员拆分变更规避监管、未按规定流程决策、未公开变更信息以及把关不严、弄虚作假、滥用职权等造成不合理变更和资产损失的，由集团公司按照干部管理权限严肃追究责任。对涉嫌违纪违法的，移交集团公司纪检监察机构处理。

第二十一条 中介机构后评价

建立中介机构后评价机制，定期评价勘察、设计、造价、监理等中介机构的履约情况，将评价结果作为后续合作的重要参考依据。对中介机构未勤勉尽责造成的不合理设计变更，应按合同追究中介机构责任。

第二十二条 备案

单项设计变更备案的具体要求按市造价管理规定执行。

第六章 其他

第二十三条 本办法所称“以上”含本数，“以下”不含本数。

第二十四条 本办法所涉及的货币种类为人民币。


第二十五条 本办法如与国家法律、法规相抵触时，按国家法律、法规的规定执行。

第二十六条 本办法由集团公司工程建管中心负责解释。

第二十七条 本办法自发布之日起实施，原《K 公司工程变更管理办法》、《K 公司工程设计变更管理办法（试行）》同时废止。

附图

工程变更审批流程图

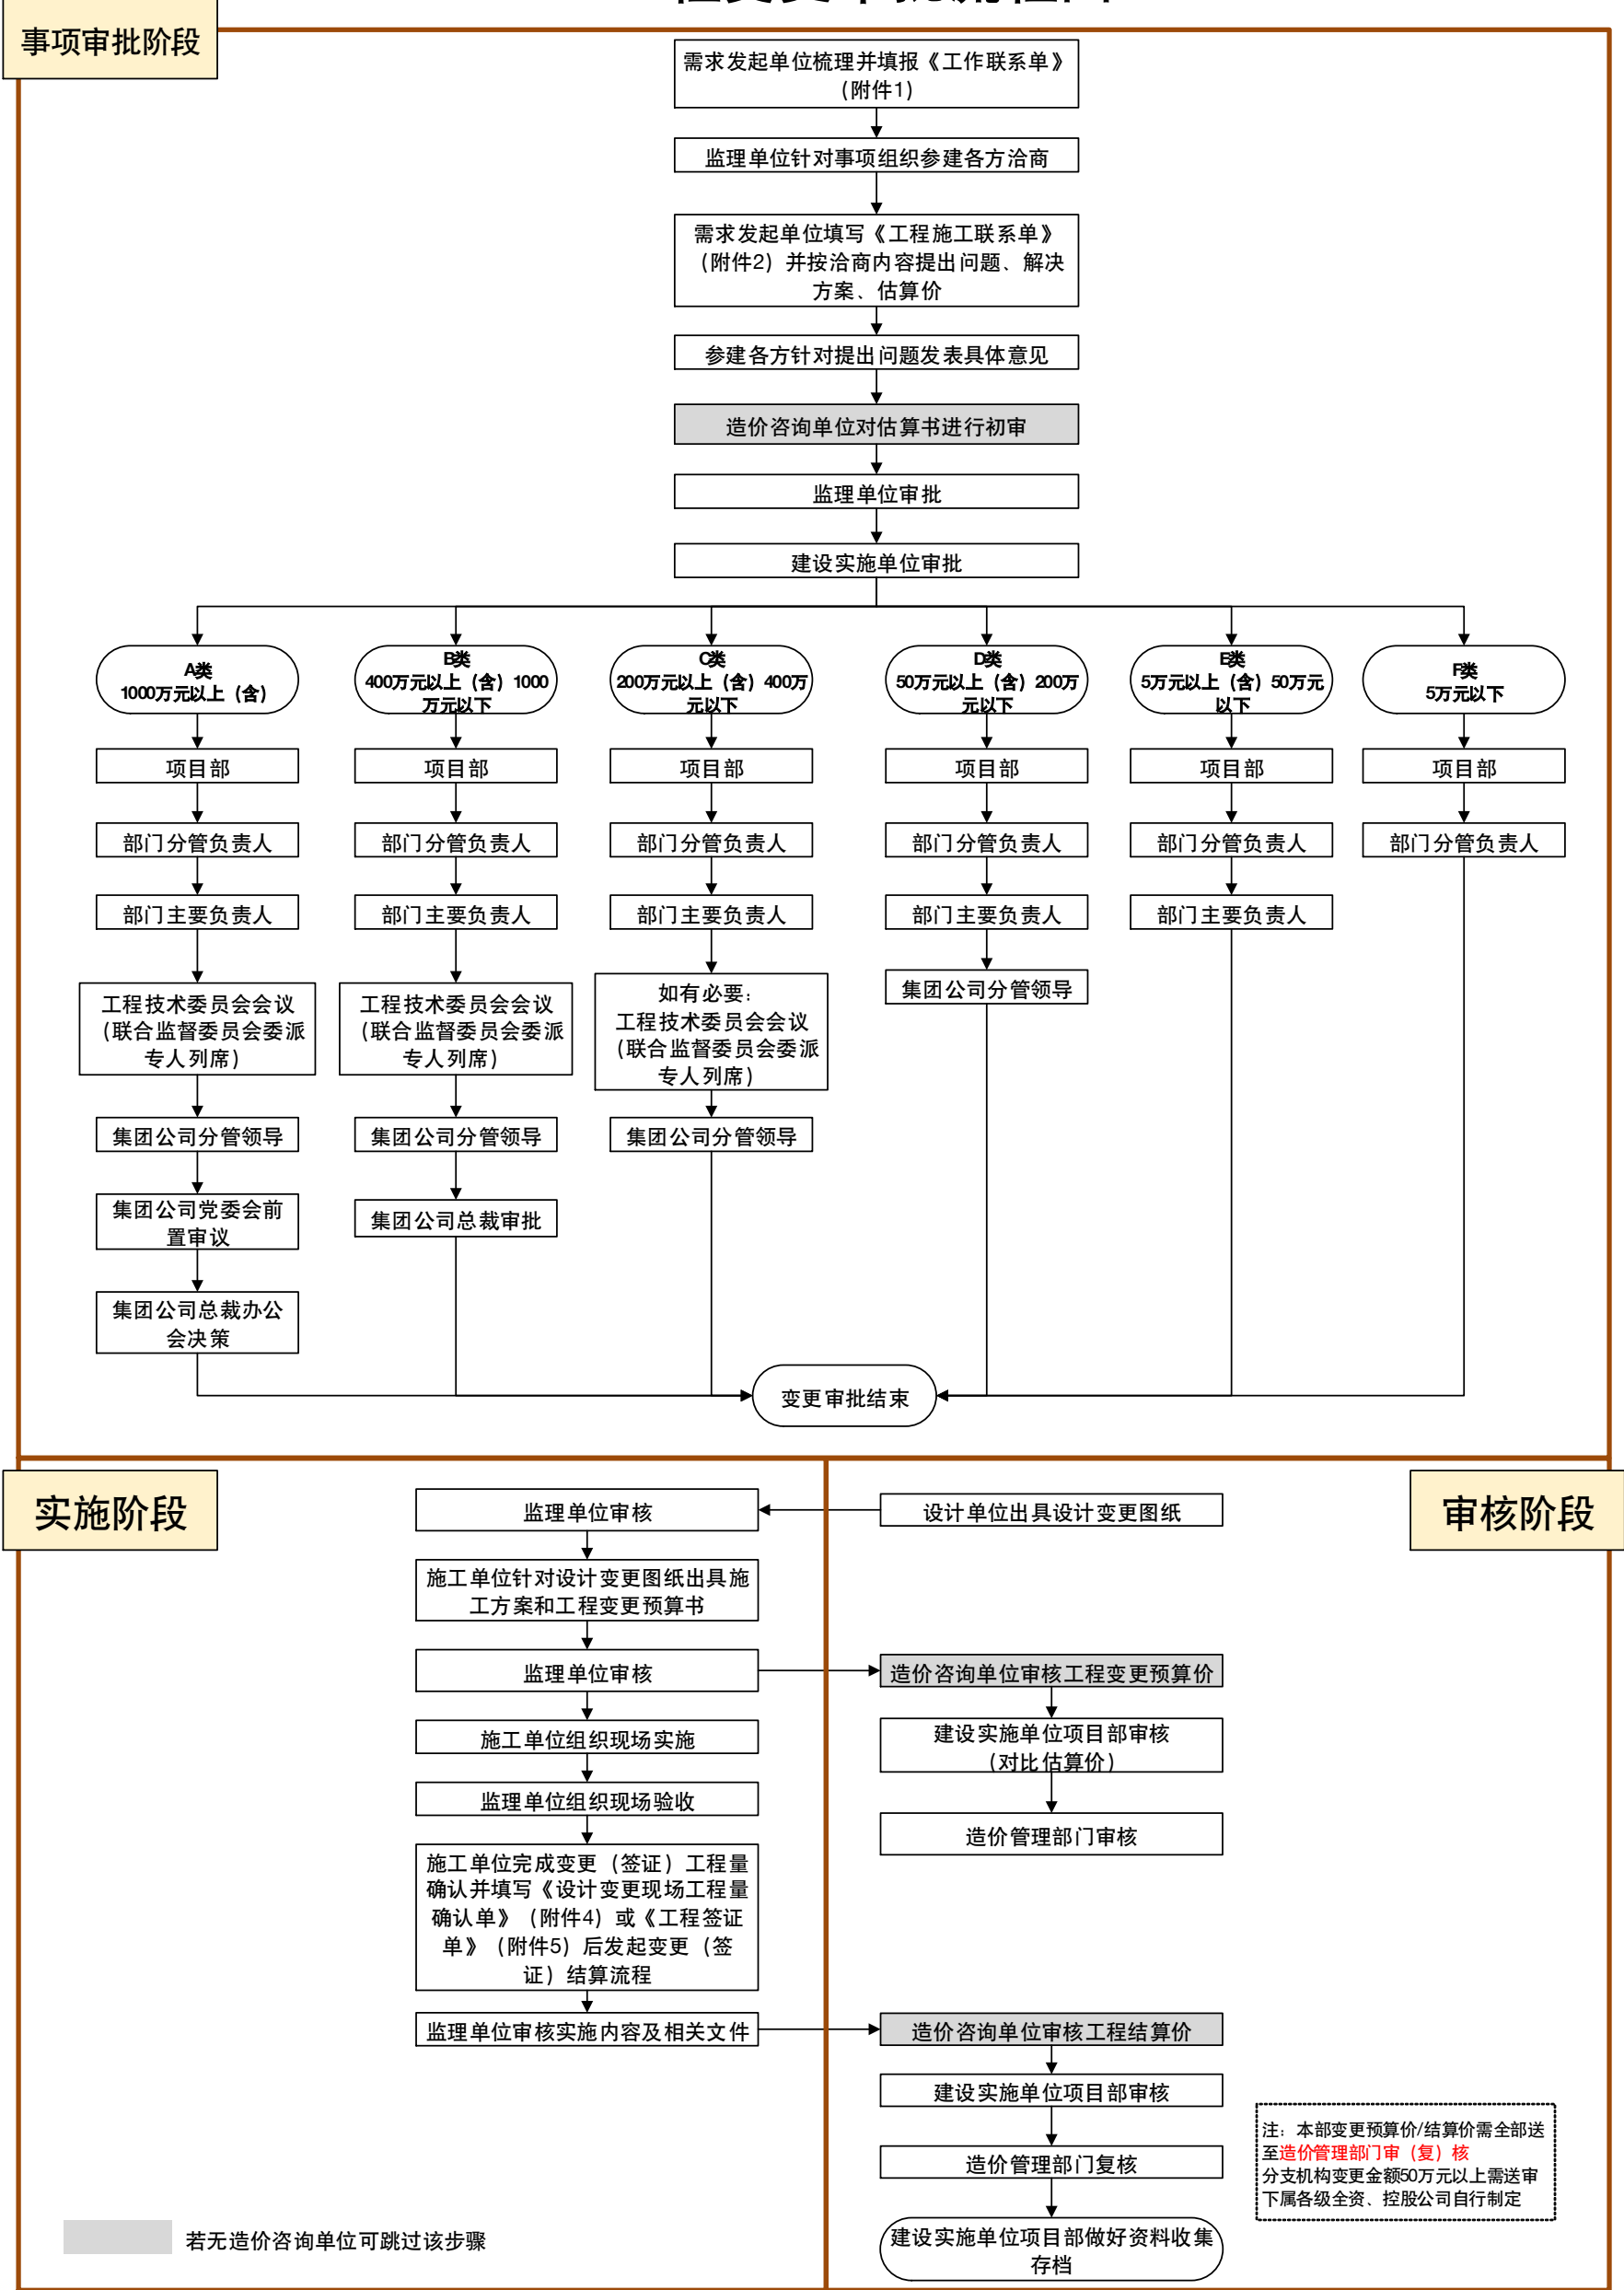

附表

设计变更分级审批指引表

变更类型	审批主体	审批流程	批准人
A 类 (1000 万元以上(含))	集团公司本部	项目部-部门分管负责人-部门主要负责人-工程技术委员会会议(联合监督委员会委派专人列席)-集团公司分管领导-集团公司党委会前置审议-集团公司总裁办公会决策	集团公司总裁办公会
	集团公司分支机构	项目部-分支机构分管负责人-分支机构主要负责人-工程技术委员会会议(联合监督委员会委派专人列席)-集团公司分管领导-集团公司党委会前置审议-集团公司总裁办公会决策	
	下属各级全资、控股公司	下属各级全资、控股公司负责人-工程技术委员会会议(联合监督委员会委派专人列席)-集团公司分管领导-集团公司党委会前置审议-集团公司总裁办公会决策	
B 类 (400 万元以上(含) 1000 万元以下)	集团公司本部	项目部-部门分管负责人-部门主要负责人-工程技术委员会会议(联合监督委员会委派专人列席)-集团公司分管领导-集团公司总裁审批	集团公司总裁
	集团公司分支机构	项目部-分支机构分管负责人-分支机构主要负责人-工程技术委员会会议(联合监督委员会委派专人列席)-集团公司分管领导-集团公司总裁审批	
	下属各级全资、控股公司	下属各级全资、控股公司负责人-工程技术委员会会议(联合监督委员会委派专人列席)-集团公司分管领导-集团公司总裁审批	
C 类 (200 万元以上(含) 400 万元以下)	集团公司本部	项目部-部门分管负责人-部门主要负责人-如有必要: 工程技术委员会会议(联合监督委员会委派专人列席)-集团公司分管领导审批	集团公司分管领导
	集团公司分支机构	项目部-分支机构分管负责人-分支机构主要负责人-如有必要: 工程技术委员会会议(联合监督委员会委派专人列席)-集团公司分管领导审批	
	下属各级全资、控股公司	下属各级全资、控股公司负责人-如有必要: 工程技术委员会会议(联合监督委员会委派专人列席)-集团公司分管领导报备	

D 类 (50 万元 以上(含) 200 万元以 下)	集团公司本部	项目部-部门分管负责人-部门主要负责人-集团公司分管 领导审批	集团公司分管 领导
	集团公司分支机 构	项目部-分支机构分管负责人-分支机构主要负责人-集团 公司分管领导审批	
	下属各级全资、 控股公司	按照各自公司发布经备案的《设计变更管理办法》审批权 限进行审批后，向集团公司工程建管中心备案	备案
E 类 (5 万元以 上(含) 50 万元以下)	集团公司本部	项目部-部门分管负责人-部门主要负责人审批	部门主要负 责人
	集团公司分支机 构	项目部-分支机构分管负责人-分支机构主要负责人审批	分支机构主要 负责人
	下属各级全资、 控股公司	按照各自公司发布经备案的《设计变更管理办法》审批权 限进行审批后，向集团公司工程建管中心备案	备案
F 类 (5 万元以 下)	集团公司本部	项目部-部门分管负责人审批	部门分管负 责人
	集团公司分支机 构	项目部-分支机构业务部门-分支机构分管负责人审批	分支机构分管 负责人
	下属各级全资、 控股公司	按照各自公司发布经备案的《设计变更管理办法》审批权 限进行审批后，向集团公司工程建管中心备案	备案

附件 1

工作联系单

工程名称:

致:

事由:

内容:

发文单位（盖章）：

负责人（签字）：

年 月 日

附件 2

工程设计变更（签证）联系单（pm 系统审批后生成）

工程名称	(自行选取工程)	预估造价	(自行填写, 允许正负)
联系单编号	(系统生成)	工程部位	(自行填写)
图号	(在设计文件浏览 中选择) 非必填	主要原因	(自行选取)
联 系 内 容	原因: (自行填写)		
	解决方案: (自行填写)		
	XX 单位: (盖章)		
	经 办 人:		
项目经理:			
年 月 日			
XX 单位:	XX 单位:	XX 单位:	建设单位:
年 月 日 (公章)	年 月 日 (公章)	年 月 日 (公章)	年 月 日 (公章)

附件 3

工程设计变更呈批表 (pm 系统审批后生成)

申请单位	(XX 项目组)	经 办 人	(综合管理 员)	变更金额	(自行填 写)
设计单位	(带出工程设计 单位、允许修 改)	施工单位	(带出施工设 计单位、允许 修改)	监理单位	(带出工 程监理单 位、允许修 改)
标题	标题规范: X X X X (工程名称) X X X (部位) X X X (变更) 的 请示 (灰色字, 仅提示, 内容自行填写)				
变更事项	本栏目填写内容应包括以下三部份: 1、变更的必要性 (变更的缘由和依据及附件); (一栏文字说明栏 + 附件上传部分) 2、变更的可行性 (变更方案分析及附件); (一栏文字说明栏 + 附件上传部分) 3、变更的金额 (变更的估算及附件); (一栏文字说明栏 + 附件上传部分)				
审批流程及意见	(审批流程及意见)				

集团分管领导意见	(集团分管领导单列一行，审批流程及意见)
附件	1、变更方案 (附件上传位置) 2、委员会会议纪要 (附件上传位置) 3、说明正文 (附件上传位置) 4、其他 (附件上传位置)
重大设计变更审批流程	(在变更与阶段——技术委员会评审选择一份后，在此处带出所有附件)

附件 4

设计变更现场工程量确认单

工程名称:

现场确认单编号:

合同名称		合同编号	
施工联系单编号		设计变更通知单编号	
施 工 期 限		分部分项名称	
附工程量计算书 施工单位（盖章）： 项目经理： 申请时间：			
监 理 单 位	咨 询 单 位	建 设 单 位	
现场审核工程量意见： 监理单位（盖章）： 监理工程师： 总监理工程师： 日期：	现场审核工程量意见： 咨询单位（盖章）： 项目负责人： 日期：	现场审核工程量意见： 建设单位（盖章）： 专业工程师： 项目负责人： 日期：	

注：1. 《设计变更现场工程量确认单》必须在已确认的变更事项完毕后 14 个日历天内及时办理。2. 本表一式四份，建设单位执两份，监理和施工单位各执一份。

附件 5

工程签证单

工程名称			
工程部位			
签 证 原 因 和 内 容			
	施工单位（盖章）：		
	项目负责人： 经办人： 年 月 日		
监理单位意见：	咨询单位意见：	建设单位意见：	
专业监理工程师： 总监理工程师（盖章）：	项目负责人签字（盖章）：	现场代表签字： 负责人签字（盖章）：	
年 月 日	年 月 日	年 月 日	

附件 6

建设工程设计专家咨询意见表

[illegible]

附件 7

工程技术委员会审查意见

工程名称			
变更事宜			
会审日期			
序号	审查结果意见		
1			
2			
3			
4			
参加会审单位及人员			
姓名	部门	意见	
联合监督委员会监督人员			
姓名	部门	意见	

复核人:

记录人:

年 月 日

附件 8

设计变更台账

报送时间: 年 季度											
填报人:											
单位: 万元											
合同名称							批复建安费				
合同编号							合同价				
建设单位							项目负责人及电话				
本单位报送变更金额合计							累计增加金额是否占合同价的 5%		☐ 是 ☐ 否		
序号	设计变更号	变更发起日期	本次变更金额 (万元)		累计变更金额 (万元)		变更责任单位	变更主要内容	累计增加金额占合同比率 5%	审批进展	是否在阳光采购平台公示
			估值	核准	估值	核准					

填写说明: 1. 表中金额单位: 万元人民币。

2. 表中金额估值以《设计变更联系单》预估造价栏中的审核估计金额为准, 核准金额已经过审核后的可作为结算依据的核准金额为准。

3. 本表由项目部填报, 每次更新, 应附对应《设计变更联系单》《设计变更洽商记录》等作为附件。

4. 表中审批进度栏按变更等级填写, 如该等级无需此项审批的填写"/"; 已完成审批的填写“已完成”或填写与之相关会议纪要或 MIS 审批表的完成时间, 并附 MIS 审批表或会议纪要作为台账附件; 正在审批过程中的流程填写“进行中”。

5. 设计变更涉及造价调整累计金额数值为正负向变更金额绝对值之和。

6. 变更金额 400 万元以上的重大设计变更和累计金额超合同价 5% 以上的设计变更须在阳光采购平台进行对外公示。
